PROPOSITION DE PARTENARIAT À TIKA

Le Programme CAEF Connect

Le programme de digitalisation des CAEF et des structures dépendantes

Première étape proposée : le pilote au CAEF Cameroun, à Dixinn

Destinataire : TIKA, Agence turque de coopération et de coordination

Bénéficiaire : Direction Générale des CAEF

Présenté par : Boubacar Yarie BANGOURA, Lead Developer Product & Chef de Projet Digital

Date : octobre 2026

Sommaire

1. Le programme en bref
2. Le constat au CAEF Cameroun
3. La plateforme, outil du programme
4. Première étape : le pilote de Dixinn
5. Cas d'usage au CAEF Cameroun
6. Aperçu des écrans clés
7. Un dossier de conception déjà rédigé
8. Budget
9. Ce que nous demandons à TIKA
10. Nos engagements
11. Critères de succès du pilote
12. Prochaines étapes et contact

1. Le programme en bref

Le Programme CAEF Connect est le programme de digitalisation des CAEF et des structures dépendantes. Il fait passer leur gestion du papier à des données fiables, partagées et vérifiables.

Son outil est la plateforme CAEF Connect : chaque centre y gère ses bénéficiaires, ses formations et sa boutique, et la Direction Générale pilote l'ensemble sur les mêmes chiffres. Le programme avance par étapes, et chaque étape ne démarre qu'après le bilan de la précédente.

La première étape est un pilote dans un seul centre, le CAEF Cameroun, dans la commune de Dixinn à Conakry. Nous proposons à TIKA, Agence turque de coopération et de coordination, d'accompagner cette première étape en offrant aux CAEF sa réalisation et son démarrage.

Élément	Proposition
Programme	Programme CAEF Connect, digitalisation des CAEF et des structures dépendantes
Outil	La plateforme CAEF Connect, de gestion et de pilotage
Première étape	Pilote au CAEF Cameroun, quartier Cameroun, commune de Dixinn, Conakry, sur 13 mois indicatifs
Étapes suivantes	Extension par vagues aux autres CAEF et aux structures dépendantes, après le bilan du pilote
Bénéficiaire	Direction Générale des CAEF
Partenaire sollicité	TIKA, pour la première étape
Porteur du programme	Boubacar Yarie BANGOURA, Lead Developer Product & Chef de Projet Digital

Le programme est porté par Boubacar Yarie BANGOURA, Lead Developer Product & Chef de Projet Digital. Il a travaillé au CAEF Cameroun à Dixinn comme consultant digital et communication, où il a constaté directement les limites de la gestion sur papier et l'écart entre les chiffres de la comptable et ceux de la responsable du centre. Il a conduit la conception de CAEF Connect et en assurera la direction de projet et la conduite technique.

Ce document présente le constat, la plateforme, le pilote proposé, des cas d'usage concrets et des maquettes des écrans clés, puis les volets que nous souhaitons convenir par écrit avec TIKA. Le périmètre du pilote reste à formaliser par la Direction Générale des CAEF.

2. Le constat au CAEF Cameroun

Au CAEF Cameroun, toute la gestion repose encore sur le papier, et les chiffres du centre ne concordent pas d'une personne à l'autre.

- **Livrets et feuilles volantes.** Bénéficiaires, présences, ventes et caisse sont tenus à la main, sans aucun système existant.
- **Deux versions des chiffres.** Les montants tenus par la comptable diffèrent de ceux de la responsable du centre.
- **Pas de vue d'ensemble.** La Direction Générale ne dispose pas d'une vue consolidée et fiable de ses centres.

- **Des résultats difficiles à prouver.** Les résultats présentés aux partenaires sont difficiles à relier à leurs sources.

3. La plateforme, outil du programme

CAEF Connect fait saisir chaque donnée une seule fois, pour que tout le monde travaille sur les mêmes chiffres. Chaque centre y gère ses bénéficiaires, ses formations et sa boutique ; la Direction Générale pilote le réseau sur des données vérifiables.

Public	Ce que CAEF Connect lui apporte
Le centre	Un dossier unique par bénéficiaire, des présences suivies sans double saisie, des rapports produits sans ressaisie
Les femmes productrices	Les ventes de leurs produits et la part qui leur revient sont tracées : leurs revenus deviennent mesurables
La Direction Générale	Des indicateurs définis, consolidés et reliés à leurs sources
Les partenaires, dont TIKA	Des rapports chiffrés et justifiés sur l'usage de leurs contributions, du promis au reçu puis à l'exécuté

Le principe qui guide l'outil : une proposition ne vaut pas convention, une convention ne vaut pas encaissement, un encaissement ne vaut pas preuve d'exécution. Chaque indicateur distingue le déclaré du vérifié.

4. Première étape : le pilote de Dixinn

La première étape du programme livre un premier lot complet dans un seul centre, le CAEF Cameroun, sur 13 mois indicatifs. La crèche, l'insertion et les portails partenaires viendront plus tard, après le bilan du pilote.

Périmètre du premier lot

Module	Contenu
Socle	Utilisateurs, bénéficiaires, formations, présences, tableaux de bord, rapports, sécurité et sauvegardes
RSE et partenaires	Prospection, conventions, contributions reçues et justifiées, tableau de bord RSE
Boutique	Catalogue, stock, ventes avec reçus numérotés, caisse, reversements aux productrices
Clôture mensuelle	Rapprochement vérifié par la comptable, validé par la responsable, puis mois verrouillé

La boutique du centre

La boutique rend visibles les revenus des femmes qui y déposent leurs produits.

1. **Dépôt.** La productrice dépose son produit et l'entrée en stock est enregistrée.

2. **Vente.** Chaque vente reçoit un reçu numéroté en continu.
3. **Clôture de caisse.** Chaque jour, la caisse est comptée et validée.
4. **Reversement.** La part de la productrice lui est reversée et tracée.

Aucun prélèvement n'est fait sur les recettes des productrices pour financer la plateforme.

Calendrier indicatif

Période	Phase	Contenu
Mois 1 à 4	Cadrage et conception	Diagnostic du centre, inventaire des registres papier, validation des documents
Mois 5 à 8	Développement du premier lot	Le socle d'abord, puis la RSE et la boutique en parallèle
Mois 9 et 10	Tests et formation	Recette, reprise des registres papier, équipement du centre
Mois 11 à 13	Pilote au centre	Usage réel, clôtures mensuelles, bilan et décision

Ce calendrier sera recalé après le diagnostic du centre, la validation du périmètre et l'estimation du prestataire retenu.

5. Cas d'usage au CAEF Cameroun

Les cas ci-dessous décrivent des situations quotidiennes du centre de Dixinn, telles qu'elles se passent aujourd'hui et telles qu'elles se passeront avec CAEF Connect. Ils suivent la vie du centre : d'abord la gestion des bénéficiaires et des formations, puis les partenaires et la Direction Générale, enfin les finances et la boutique. Ils serviront de scénarios de démonstration et de recette pendant le pilote.

Domaine	Cas d'usage	Utilisateurs principaux
A. Gestion du centre	5.1 à 5.7 : accueil, parcours, sessions, présences, attestations, pilotage, rapport mensuel	Agent administratif, responsable pédagogique, formatrices, responsable du centre
B. Partenaires et Direction	5.8 à 5.11 : partenariat RSE, rapport partenaire, suivi national, droits d'accès	Responsable RSE, Direction Générale, administrateur
C. Finances et boutique	5.12 à 5.16 : clôture du mois, dépôt, caisse, reversement, inventaire	Comptable, vendeuse, responsable du centre, productrices
D. Mise en route	5.17 : reprise des registres papier	Équipe du centre, prestataire

A. Gestion du centre

5.1 L'accueil et l'inscription d'une nouvelle bénéficiaire

Qui : l'agent administratif

Aujourd'hui : la candidate remplit une fiche papier, rangée dans un classeur. Rien n'empêche d'ouvrir un deuxième dossier pour une femme déjà venue, et une fiche incomplète passe inaperçue.

Avec CAEF Connect : l'agent recherche d'abord si la personne est déjà connue ; l'outil signale les doublons possibles. La candidature est enregistrée, l'outil vérifie que les champs obligatoires sont remplis, puis la responsable la valide ou la rejette avec un motif. Une liste d'attente est tenue quand les places manquent.

Ce que cela change : chaque femme a un seul dossier, complet, avec l'historique de chaque décision.

5.2 Le suivi d'une bénéficiaire tout au long de son parcours

Qui : l'agent administratif, la responsable du centre

Aujourd'hui : pour savoir ce qu'une femme a suivi, il faut fouiller plusieurs cahiers et feuilles volantes. Son parcours et ses revenus ne sont visibles nulle part.

Avec CAEF Connect : sa fiche affiche son parcours dans l'ordre : candidature, inscriptions, présences, formations achevées. Si elle dépose ses produits en boutique, ses ventes et ses reversements y apparaissent aussi. Les pièces jointes sont à accès restreint.

Ce que cela change : le centre peut montrer ce que le parcours a changé pour elle, revenus compris. (voir figure 2)

5.3 La programmation des sessions de formation

Qui : la responsable pédagogique

Aujourd'hui : les sessions sont organisées au tableau ou dans un cahier. Le nombre d'inscrites peut dépasser les places sans que personne le voie.

Avec CAEF Connect : la responsable crée chaque session à partir du catalogue des formations, avec dates, horaires, lieu et capacité, et y affecte une formatrice. L'outil refuse une session incomplète et alerte quand la capacité est dépassée. Les bénéficiaires validées y sont inscrites.

Ce que cela change : le planning du centre est clair, à jour et partagé.

5.4 L'appel en séance sur téléphone

Qui : les formatrices

Aujourd'hui : les présences sont notées sur des feuilles volantes, qui se perdent ou arrivent en retard au bureau.

Avec CAEF Connect : à chaque séance, la formatrice coche les présences et les absences sur son téléphone. Le statut de chaque participante (inscrite, commencée, achevée, suspendue, abandonnée) se met à jour.

Ce que cela change : les absences répétées se voient tout de suite, et le taux de présence est calculé sans ressaisie.

5.5 La fin d'une session et la délivrance des attestations

Qui : la responsable pédagogique, la responsable du centre

Aujourd'hui : les résultats et les attestations sont gérés à la main, sans contrôle des conditions de réussite.

Avec CAEF Connect : les évaluations sont saisies et chaque modification est tracée. Une attestation n'est enregistrée que si les conditions du programme sont remplies. La session est clôturée, son rapport produit, et elle ne peut plus être modifiée sans droit particulier.

Ce que cela change : chaque attestation délivrée est justifiée et vérifiable.

5.6 Le pilotage quotidien par la responsable du centre

Qui : la responsable du centre et son adjointe

Aujourd'hui : pour connaître la situation du centre, la responsable doit demander à chacun et additionner des cahiers.

Avec CAEF Connect : en ouvrant l'outil, elle voit son tableau de bord : bénéficiaires actives, sessions en cours, présences, ventes, reversements dus, et les tâches qui l'attendent (validations, dossiers incomplets, clôtures). Pendant son absence, un intérim déclaré permet à son adjointe de valider à sa place.

Ce que cela change : la responsable pilote son centre sur des chiffres du jour, sans attendre la fin du mois. (voir figure 1)

5.7 Le rapport mensuel du centre

Qui : la responsable du centre

Aujourd'hui : le rapport est recopié à la main à partir des cahiers, avec des chiffres difficiles à vérifier.

Avec CAEF Connect : le rapport périodique du centre est produit à partir des données saisies, avec sa période et sa date de production. Les listes peuvent être exportées, et chaque export est journalisé.

Ce que cela change : le rapport part à temps, et chaque chiffre renvoie à ses données sources.

B. Partenaires et Direction Générale

5.8 Le suivi d'un partenariat RSE, de la prospection à la convention

Qui : la responsable RSE et partenariats

Aujourd'hui : les contacts avec les entreprises sont suivis de mémoire ou dans un carnet personnel. Une promesse orale peut être comptée comme acquise.

Avec CAEF Connect : chaque partenaire a sa fiche, avec ses interlocuteurs et l'historique des échanges. L'opportunité avance dans un pipeline par étapes ; la proposition est validée en interne avant envoi ; la convention signée est enregistrée avec ses engagements et ses échéances, et l'outil alerte avant chaque échéance.

Ce que cela change : le centre distingue clairement ce qui est promis, signé, reçu et exécuté. (voir figure 3)

5.9 Le rapport à un partenaire, dont TIKA

Qui : la responsable RSE et partenariats

Aujourd'hui : pour rendre compte à un partenaire, il faut rassembler des chiffres dispersés dans plusieurs cahiers, sans pouvoir toujours les justifier.

Avec CAEF Connect : chaque contribution est suivie de la promesse à la réception, avec son justificatif, puis validée. Le rapport partenaire est généré à partir de ces enregistrements.

Ce que cela change : TIKA recevra un rapport chiffré et justifié sur l'usage de sa contribution : équipement livré, personnes formées, utilisation réelle de l'outil. (voir figure 3)

5.10 La Direction Générale suit le centre pilote

Qui : la Direction Générale des CAEF

Aujourd'hui : elle attend des rapports papier, produits avec retard et difficiles à vérifier.

Avec CAEF Connect : elle consulte un tableau de bord dont chaque indicateur a une définition validée, une date de mise à jour et un niveau de validation, et renvoie à ses données sources. Les données sont agrégées, sans information nominative par défaut.

Ce que cela change : les décisions sur la suite du programme se prennent sur des chiffres vérifiables.

5.11 Les droits d'accès : chacun voit ce qui le concerne

Qui : l'administrateur, tous les utilisateurs

Aujourd'hui : les cahiers et les classeurs sont accessibles à qui les ouvre, et rien ne dit qui a modifié quoi.

Avec CAEF Connect : chaque utilisateur a un compte personnel et un rôle limité à ce dont il a besoin : la vendeuse ne voit pas les dossiers des bénéficiaires, la responsable RSE ne voit que des chiffres agrégés. Les données d'un centre ne sont pas visibles depuis un autre. Les actions sensibles (validation, export, changement de droits) sont journalisées.

Ce que cela change : les données des femmes sont protégées, et chaque action a un auteur identifié.

C. Finances et boutique

5.12 La fin du mois entre la comptable et la responsable

Qui : la comptable du centre, la responsable du centre

Aujourd'hui : chacune tient ses propres cahiers. En fin de mois, les deux totaux ne concordent pas, et rien ne permet de savoir lequel est juste.

Avec CAEF Connect : l'outil génère l'état de rapprochement du mois à partir des ventes, des caisses, des reversements et des contributions reçues. La comptable le vérifie face aux pièces, la responsable le valide, puis le mois est verrouillé.

Ce que cela change : la comptable, la responsable et le rapport mensuel affichent les mêmes chiffres. Une correction après verrouillage passe par une écriture du mois suivant. (voir figure 4)

5.13 Le dépôt d'un produit par une productrice

Qui : la vendeuse de la boutique, les productrices

Aujourd'hui : les dépôts sont notés dans un cahier, sans toujours préciser le prix convenu ni la part qui revient à la productrice.

Avec CAEF Connect : chaque produit est inscrit au catalogue avec sa catégorie, son prix et son origine (atelier du centre, productrice ou groupement en dépôt-vente). L'entrée en stock est enregistrée au nom de la productrice. Un changement de prix est daté et n'affecte pas les ventes passées.

Ce que cela change : le stock est connu à tout moment, et chaque productrice sait ce qu'elle a déposé.

5.14 La clôture de caisse du soir

Qui : la vendeuse de la boutique, la responsable du centre

Aujourd'hui : les ventes sont notées dans un carnet. Un manque dans la caisse est souvent découvert des jours plus tard, sans que personne puisse l'expliquer.

Avec CAEF Connect : chaque vente reçoit un reçu numéroté. Le soir, l'outil calcule les espèces attendues ; la vendeuse compte la caisse et saisit le montant. Tout écart doit être motivé avant la validation par la responsable. Une vente annulée reste visible, corrigée par contre-écriture. En cas de coupure de connexion, un reçu papier numéroté sert de secours et la vente est saisie dans la journée.

Ce que cela change : un écart est repéré le jour même, expliqué et tracé. (voir figure 5)

5.15 Le reversement mensuel aux productrices

Qui : la comptable du centre, la responsable du centre, les productrices

Aujourd'hui : la part de chaque productrice est calculée à la main à partir du carnet de ventes, ce qui laisse place aux oublis et aux contestations.

Avec CAEF Connect : la part de la productrice est calculée vente par vente. La comptable prépare le reversement, la responsable le valide, et le paiement est enregistré avec sa date et sa pièce. Le solde restant dû reste affiché.

Ce que cela change : chaque productrice sait ce qui lui revient et pourquoi, et le centre peut le prouver.

5.16 L'inventaire de la boutique

Qui : la vendeuse, la responsable du centre

Aujourd'hui : il n'y a pas d'inventaire régulier : personne ne sait si le stock réel correspond aux ventes.

Avec CAEF Connect : à intervalles réguliers, le stock est compté et comparé au stock calculé par l'outil. Les écarts sont motivés, et l'ajustement est validé par la responsable ou son adjointe.

Ce que cela change : les pertes et les erreurs de stock deviennent visibles au lieu de s'accumuler.

D. Mise en route

5.17 La reprise des registres papier

Qui : l'équipe du centre, avec l'appui du prestataire

Aujourd'hui : l'historique du centre est dans des livrets et des feuilles volantes, avec des chiffres qui divergent.

Avec CAEF Connect : les registres sont inventoriés et saisis, puis importés avec un rapport d'anomalies. Les chiffres de la comptable et de la responsable sont rapprochés ; une divergence non résolue est importée avec le statut « à vérifier », jamais tranchée par supposition.

Ce que cela change : le centre démarre avec un historique propre et des écarts identifiés.

6. Aperçu des écrans clés

Les maquettes ci-dessous illustrent les écrans prévus pour le pilote. Elles sont indicatives : les écrans définitifs seront conçus avec l'équipe du centre. Les noms et les chiffres sont fictifs.



Figure 1. *Tableau de bord du centre, vu par la responsable*



Figure 2. *Fiche d'une bénéficiaire : parcours de formation et ventes en boutique*

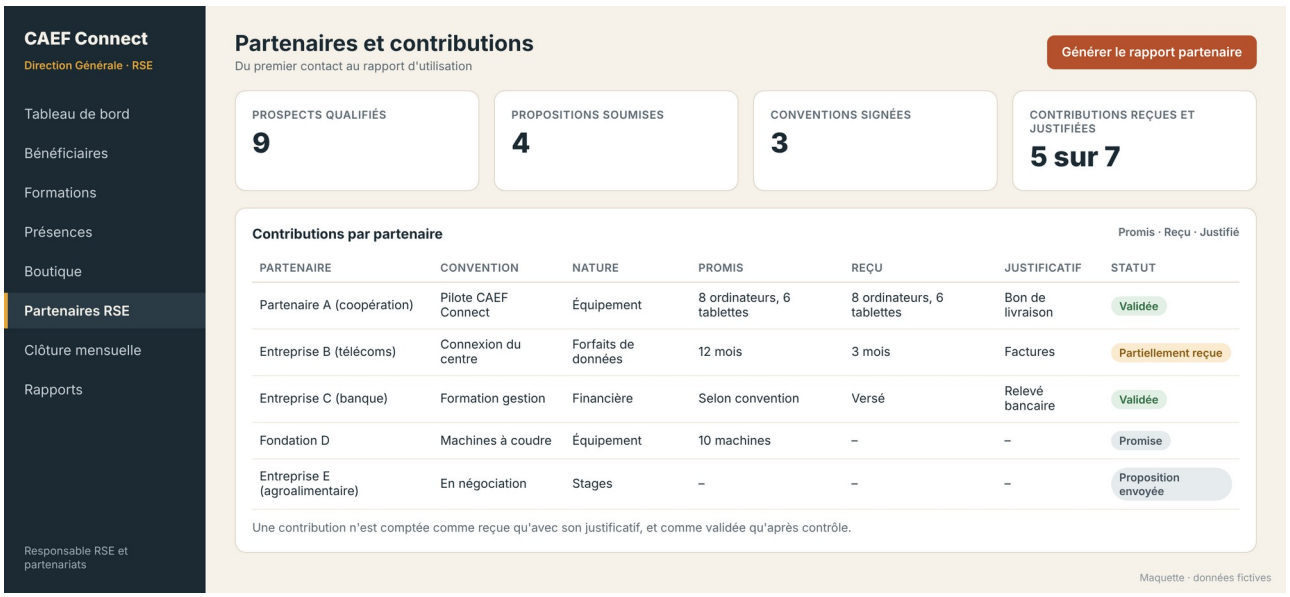


Figure 3. *Suivi des partenaires et des contributions*



Figure 4. *Clôture mensuelle : rapprochement vérifié par la comptable et validé par la responsable*

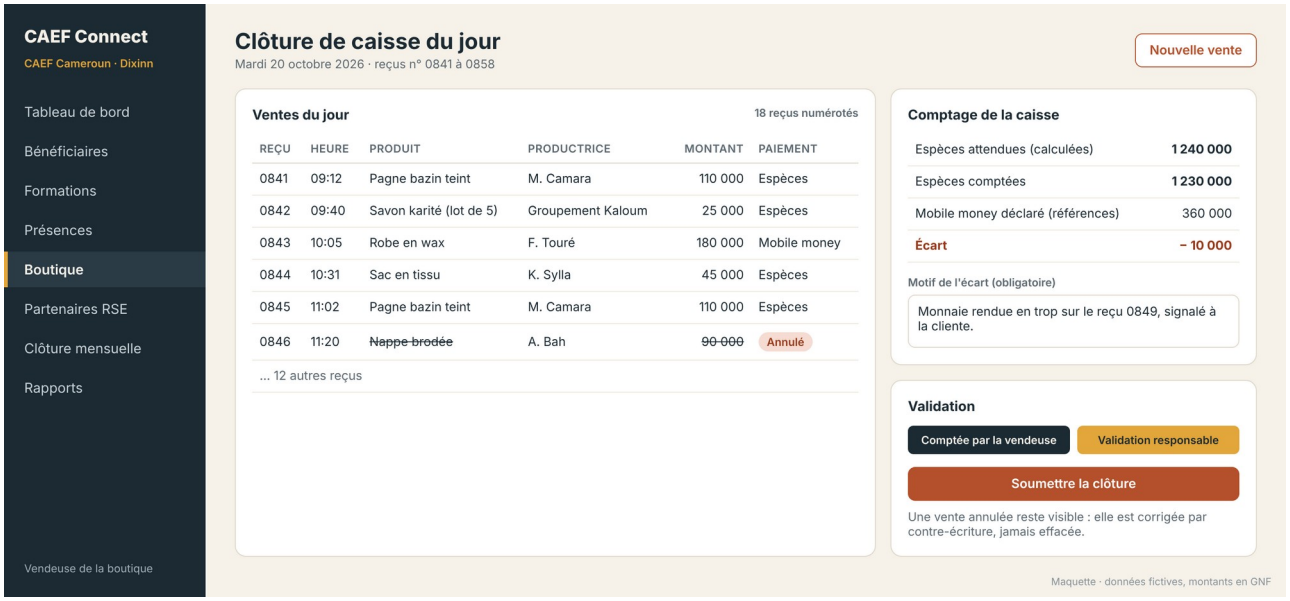


Figure 5. *Clôture de caisse du jour à la boutique*

7. Un dossier de conception déjà rédigé

Le dossier de conception est rédigé et cohérent : une exigence se suit jusqu'à son cas de test. Il reste à valider par la Direction Générale des CAEF, et un prestataire peut s'en servir pour estimer et démarrer le travail.

Document	Ce qu'il fixe
Document de cadrage produit (PRD)	Vision, objectifs et exigences priorisées
Spécifications fonctionnelles du MVP	Écrans, règles de gestion et scénarios
Matrice des rôles et permissions	Qui voit et fait quoi, centre par centre
Modèle et dictionnaire des données	50 entités, champs, contrôles et sensibilité
Dossier d'architecture technique	Pile open source, sécurité, sauvegardes
Référentiel des indicateurs	39 fiches, chacune reliée à ses sources
Plan de tests et de recette	Cinq campagnes et procès-verbal
Budget et modèle économique	Postes et scénarios, à chiffrer sur devis
Brief de démarrage développeur	Règles et ordre de construction du premier lot

Ces documents peuvent être transmis à TIKA sur demande.

8. Budget

Aucun montant n'est arrêté à ce stade : chaque poste est à chiffrer sur devis. Le budget de référence sera établi après le cadrage, sur la base de devis d'au moins deux prestataires, avec des prix relevés à Conakry et une proposition consolidée en francs guinéens à un taux daté.

Composante	Ce qu'elle couvre	Nature	Montant
Développement du MVP	Cadrage, conception, développement, tests, sécurité, reprise des registres papier, formation, mise en service	Ponctuel	À chiffrer sur devis
Hébergement et infrastructure	Serveurs, base de données, stockage, sauvegardes, nom de domaine, supervision	Récurrent	À chiffrer sur devis
Maintenance et support	Corrections, mises à jour, assistance aux utilisateurs, sécurité annuelle	Récurrent	À chiffrer sur devis
Équipement du centre pilote	Ordinateurs, tablettes, imprimantes, routeur 4G, onduleur, puis forfait de données	Ponctuel, plus connexion récurrente	À chiffrer sur devis

Le scénario recommandé est le pilote d'un seul centre sur 12 mois d'exploitation. Une extension à d'autres centres ne se décidera qu'après le bilan du pilote.

9. Ce que nous demandons à TIKA

Nous proposons que TIKA accompagne la première étape du programme en prenant en charge le coût ponctuel du pilote, ainsi que 12 à 24 mois d'hébergement, de maintenance et de support après la mise en service. Ce délai permettra aux CAEF de mettre en place un financement durable. Nous souhaitons convenir par écrit des points suivants.

Volet	Ce que nous proposons	Ce qu'il faut préciser
Développement	Réalisation du premier lot : socle, RSE, boutique et clôture mensuelle	Qui réalise, avec quelle équipe locale associée
Hébergement initial	Prise en charge pendant 12 à 24 mois	Quel hébergeur, dans quel pays, compatible avec la réglementation sur les données
Équipement	Matériel du centre pilote	Quels matériels, en quelle quantité, avec quelle garantie
Formation et accompagnement	Formation des équipes du centre et transfert de compétences	Combien de jours sur site, pour quels publics
Maintenance et support	Prise en charge pendant 12 à 24 mois	Quelle durée, quels délais de prise en charge des incidents
Propriété et sortie	Code, documentation et données aux CAEF	Passation, export des données et changement d'hébergeur à la fin de la prise en charge

10. Nos engagements

Le programme reste la propriété des CAEF et doit durer au-delà de la prise en charge de TIKA. Nous nous engageons sur six points.

- **Propriété des CAEF.** Code source, documentation et données appartiennent aux CAEF dès la livraison.
- **Aucune dépendance.** Composants open source, export complet des données, hébergeur remplaçable sans réécriture.
- **Compétences transférées.** Une équipe désignée par les CAEF est formée pendant le pilote.
- **Relais financier.** Un financeur des coûts récurrents est identifié avant la fin du pilote : budget de l'État, Direction Générale, partenaires techniques et financiers ou mécénat d'entreprises.
- **Productrices protégées.** Aucun prélèvement sur leurs recettes pour financer la plateforme.
- **Résultats rendus à TIKA.** Des rapports chiffrés et justifiés sur l'usage de la contribution, produits par l'outil lui-même.

11. Critères de succès du pilote

Le pilote sera jugé réussi si les six conditions suivantes sont remplies à son terme.

1. Le centre enregistre candidatures, sessions, présences, ventes et caisse dans l'outil, sans registre papier parallèle.

2. Chaque mois est clôturé et rapproché : la comptable et la responsable partent des mêmes chiffres.
3. Au moins un partenariat réel est suivi jusqu'à la contribution reçue et justifiée.
4. La Direction Générale consulte un tableau de bord dont chaque indicateur renvoie à ses sources.
5. La recette de sécurité ne relève aucun accès non autorisé, et une restauration de sauvegarde a réussi.
6. Les cibles d'adoption et de qualité des données, fixées pendant le diagnostic, sont atteintes ou leurs écarts expliqués.

Le bilan compare aussi les coûts réels d'exploitation au budget de référence, avant toute extension.

12. Prochaines étapes et contact

Nous attendons de TIKA un accord de principe, puis une réponse écrite sur les volets de la section 9.

1. **TIKA confirme** par écrit ce qu'elle prend en charge et pour combien de temps.
2. **La Direction Générale des CAEF valide** le pilote, son périmètre et les rôles.
3. **Deux prestataires chiffrent** le travail, poste par poste.
4. **Le pilote est lancé :** diagnostic du centre de Dixinn, puis développement du premier lot.

Contact : Boubacar Yarie BANGOURA, Lead Developer Product & Chef de Projet Digital · [téléphone] · [courriel]
